AVANCE DEL PROYECTO · SEGUNDA ETAPA

EXPERTIA


Business Management Platform

Plataforma SaaS de reservas y gestión, simple de configurar para cualquier negocio de servicios.

Ingeniería en Informática · Duoc UC

Integrantes: Maximiliano Díaz · Genesis Cáceres · Alberto Rincón

Profesor guía: Félix Cifuentes

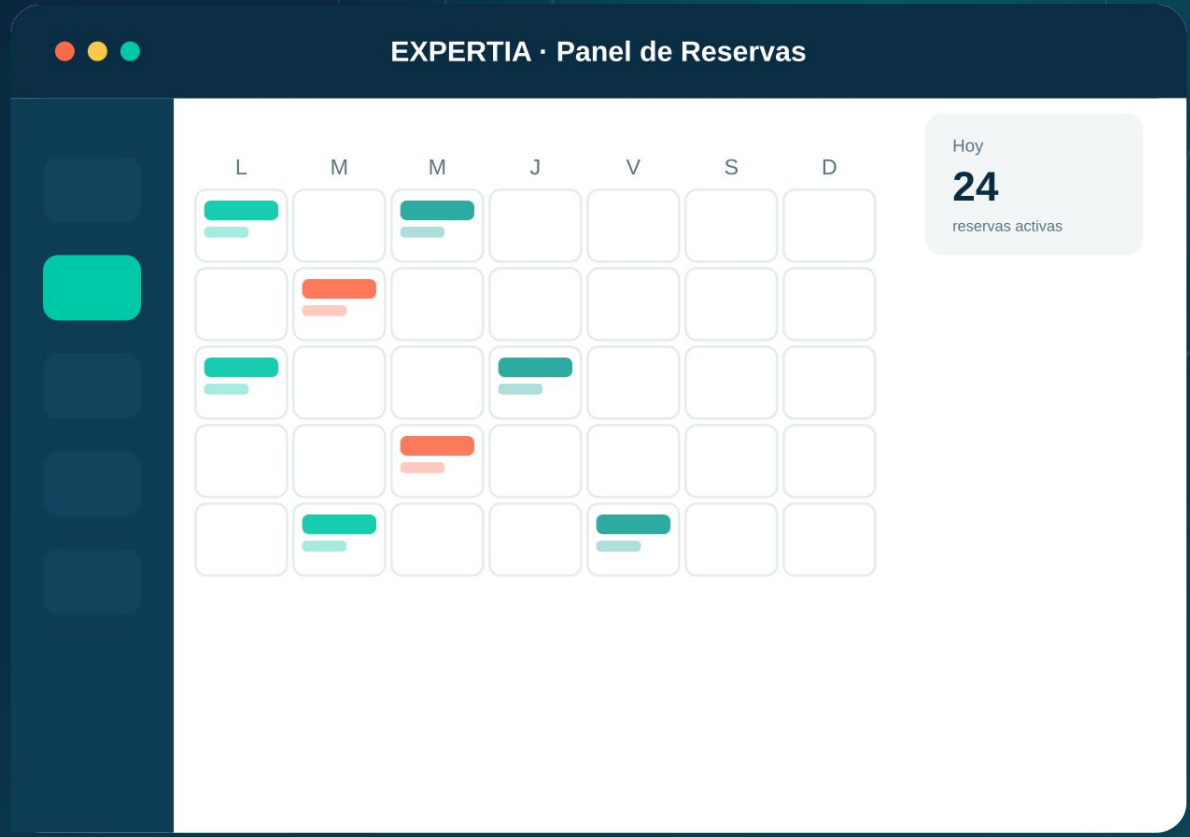

GESTIÓN DEL PROYECTO

Herramientas de Gestión y Documentación

Cada herramienta tiene una sola responsabilidad, sin solapamientos.

Jira

Proyecto CAPDC · Scrum

- ✓ Backlog, épicas e historias
- ✓ Story points y MoSCoW
- ✓ Sprints, tablero y avance

No se usa para código

Confluence

Espacio EXPERTIA-CAP26

- ✓ Discovery, SRS y casos de uso
- ✓ Arquitectura, ADR y modelo de datos
- ✓ Registro de cambios

No se usa para tareas

GitHub

Repositorio privado

- ✓ Código, commits y Pull Requests
- ✓ Revisión de un compañero
- ✓ CI con GitHub Actions

Sin Issues ni Milestones

TRAZABILIDAD ENTRE HERRAMIENTAS

Historia en Jira
CAPDC-8 · US-001

→

Commit en develop
"CAPDC-8 feat: login con JWT"

→

Pull Request
develop → main + revisión

→

Documentación
RF · caso de uso · Confluence

GESTIÓN EN JIRA

Jira: Backlog, Sprints y Avance Real

Proyecto en tablero Scrum.

49	8	29	12
issues	épicas	historias	tareas

TAXONOMÍA DE 3 DIMENSIONES POR ISSUE

Tipo — Epic · Historia · Tarea · Bug

Prioridad — Labels MoSCoW: must · should · could


Épica — 1 por módulo: IAM, Tenant, Catalog, Booking…

FLUJO DEL TABLERO

Por hacer › En curso › En revisión › Listo

Story points por sprint y estado

173 SP en total · 39 listos · 39 en revisión (PR abierto)

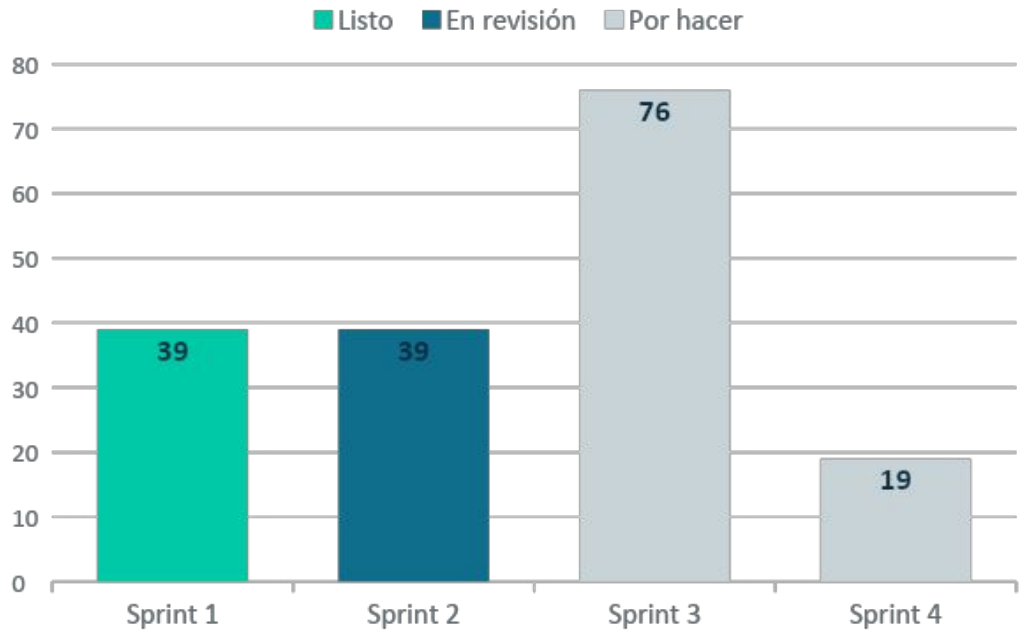

DOCUMENTACIÓN

Confluence: Documentación Viva del Proyecto

Espacio EXPERTIA-CAP26 · 19 páginas organizadas en 4 secciones, con control de cambios.

01

Discovery y Análisis

- Acta de Constitución
- Benchmark Competitivo
- Product Backlog MVP
- Requerimientos (SRS)
- Casos de Uso

02

Arquitectura y Diseño

- Arquitectura de Software
- Modelo de Dominio (DDD)
- Diseño de Base de Datos
- Estructura Backend
- Estructura Frontend

03

Preparación del Repositorio

- Configuración Jira y GitHub
- Entorno de Desarrollo Local
- Estrategia de Calidad

04

Registro de Cambios

- Cambios por fecha y versión
- Trazabilidad para la memoria de título
- Decisiones del profesor guía

Cada página es un documento vivo con su tabla de control de cambios (versión, fecha, cambio, responsable).

EJECUCIÓN

Plan de Trabajo: Estado Real por Sprint

Calendario vigente en Jira al 22 de octubre de 2026.

1

Sprint 1 — Fundacional

24 sep–11 oct · IAM + Tenant + preparación y CI · 39 SP · Cerrado ✓

2

Sprint 2 — Catálogo

14–25 oct · Catalog + modelo genérico + onboarding por rubro + landing/demo · 39 SP · En curso

3

Sprint 3 — Reservas + IA

26 oct–8 nov · Booking + motor de reservas + Asistente IA con Gemini · 76 SP

4

Sprint 4 — Cierre

9–14 nov · Notification + Reporting + QA integral · 19 SP

173

Story points

131 Must-have · 39 SP ya completados en el Sprint 1

7,5

Semanas

24 sep–14 nov, más la Etapa 10 de cierre (15–21 nov)

3

Integrantes

Sprint 0 (propuesta, documentación, mockup) cerrado

CALIDAD

Calidad e Integración Continua

Pruebas automatizadas con umbrales que bloquean el build si la cobertura baja (RNF-012).

99,6%

Cobertura backend

pytest + pytest-django · umbral 80%

88,98%

Cobertura frontend

Medido en CAPDC-40 (7 oct). La cifra bajará al implementar Catalog, Booking y Assistant; el umbral del 80% absorbe esa caída esperada.

Pipeline en GitHub Actions (ci.yml)

Push a develop

Cada commit referencia la clave Jira de la historia

Job Backend

Build Docker · makemigrations --check · ruff · import-linter · pytest

Job Frontend

ng build · ng test con Chrome headless

Pull Request develop → main

Revisión y aprobación de un compañero del equipo


main protegida

Solo se fusiona con CI en verde y revisión aprobada

PROTOTIPO


Mockup Semi-funcional: Experiencia Pública

Diseñado en el Sprint 0 (CAPDC-48) para validar flujos antes de programar.

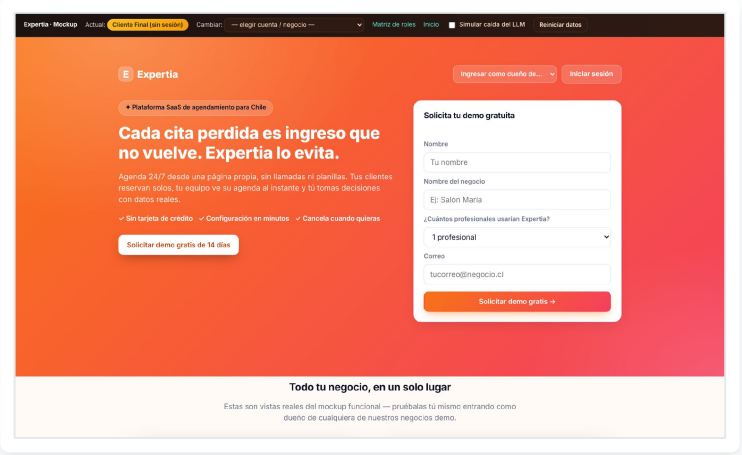


Landing

Propuesta de valor + demo de 14 días

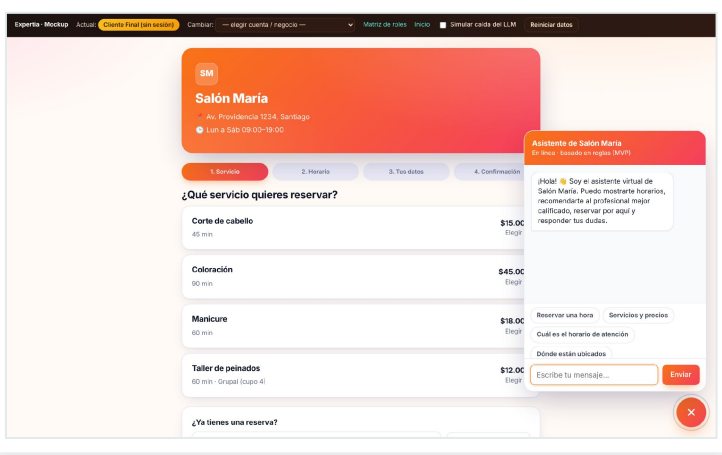

Reserva + Asistente

Flujo de 4 pasos y chat en lenguaje natural

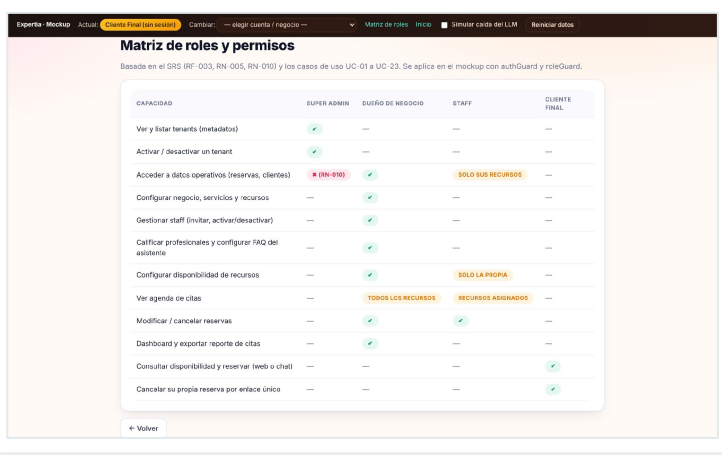

Matriz de roles


4 perfiles con permisos del SRS

Incluye 4 roles navegables (Super Admin, Dueño, Staff, Cliente), datos de demostración y simulación de caída del LLM.

PROTOTIPO


Mockup: Panel del Negocio y Administración

Vistas del dueño de negocio y del Super Admin que guían el desarrollo de los sprints.




Dashboard

Métricas del día, ingresos y ocupación




Agenda

Citas por día y semana, modificar o cancelar



Recursos

Profesionales, salas, calificación y horarios



Super Admin


Tenants registrados, solo metadatos (RN-010)

Del mockup al código: cada vista se trazó a casos de uso (UC-xx) y requisitos (RF-xxx), lo que permitió estimar las historias en Jira y construir la solución con el mismo lenguaje visual.


SOLUCIÓN EN DESARROLLO

Solución Construida: Acceso y Onboarding

Pantallas reales de la aplicación Angular + Django corriendo en contenedores.

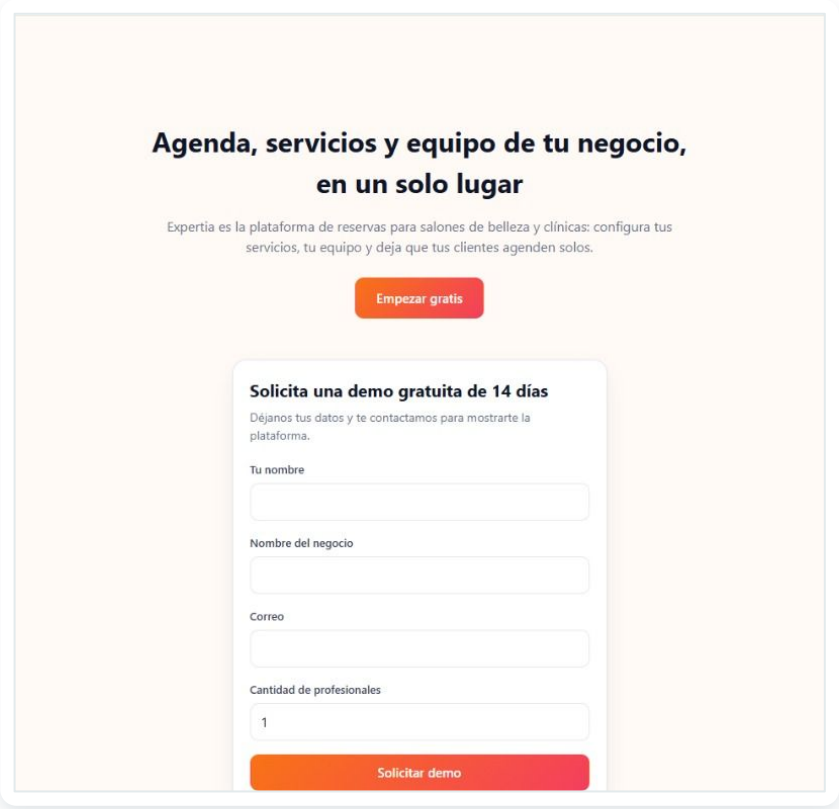

Landing pública con demo de 14 días (US-029).

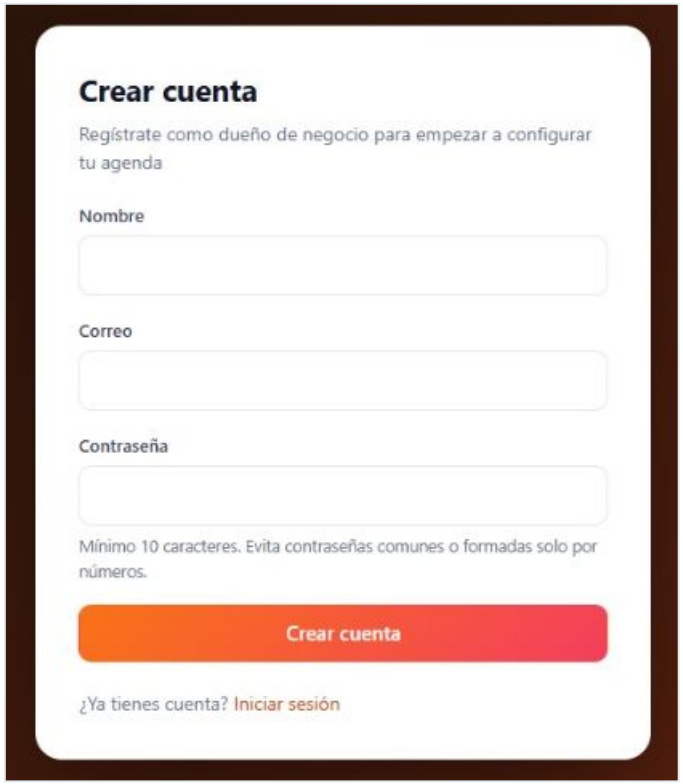

Crear cuenta del dueño de negocio.


Ya funcionando (Sprint 1)


- **US-001** Registro e inicio de sesión con JWT
- **US-002** Aislamiento de datos por tenant
- **US-003** Super Admin audita tenants
- **US-004** Registro del negocio con slug
- **US-006** Invitación y gestión de staff
- **US-007** Edición de datos del negocio


SOLUCIÓN EN DESARROLLO

Solución Construida: Gestión del Negocio

Panel del rol DUEÑO_NEGOCIO con datos aislados por tenant (US-002).

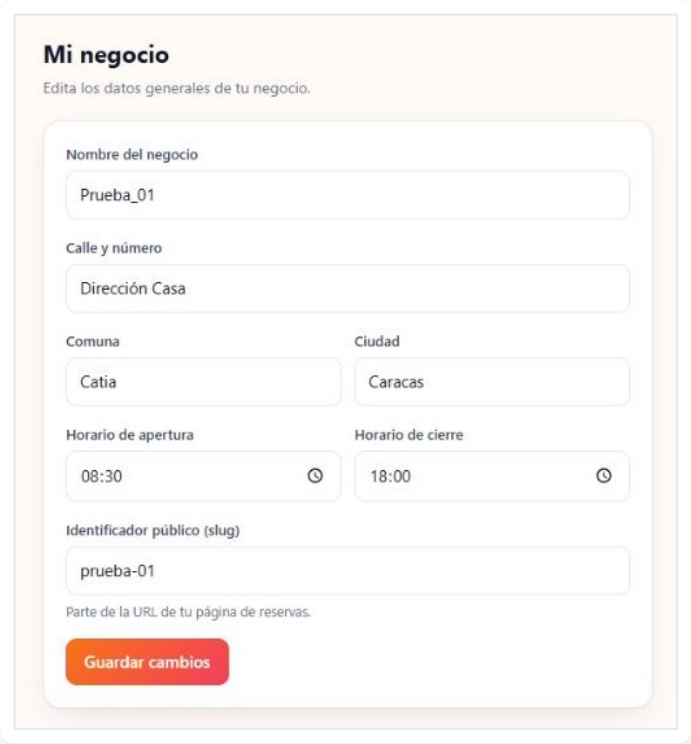



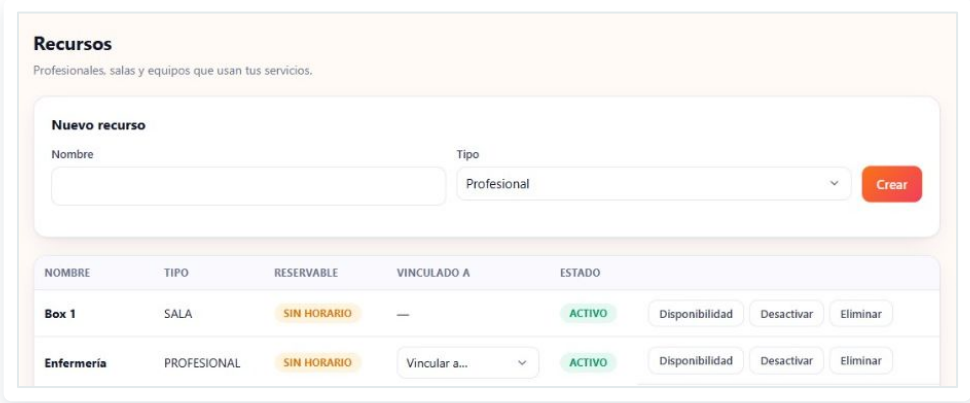

Mi negocio datos, horario y slug público (US-007).

Mi equipo

Invitación de staff por correo, fecha de ingreso y activación o desactivación de cuentas (US-006).

Recursos

Profesionales, salas y equipos; vínculo con servicios y disponibilidad horaria (US-009, US-010).

PRÓXIMOS PASOS

Camino a la Entrega Final

Lo que queda para completar el MVP y la documentación de título.

25 OCT

Cierre Sprint 2

- Revisar e integrar 6 historias en revisión
- Entrega 2 de documentación grupal

26 OCT – 8 NOV

Sprint 3 — Reservas + IA

- Motor de reservas y agenda (US-012 a 016)
- Asistente conversacional con Gemini

9 – 14 NOV

Sprint 4 — Cierre

- Notificaciones por email
- Dashboard, reporte y QA integral

15 – 21 NOV

Etapa 10 — Entrega

- Pruebas finales y Entrega 3
- Video de la demo del sistema

Regla del plan: el Asistente IA (Epic 7) nunca se recorta; si falta capacidad, se recorta primero Reporting avanzado.

Gracias

EXPERTIA · Business Management Platform

Preguntas y comentarios son bienvenidos

Maximiliano Díaz · Genesis Cáceres · Alberto Rincón
